



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w.

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN
Fax 015/55 06 30

DISTRIBUTIEBEHEERDER:

Meter nr.: 3285885

Index: Dag: 1 KWh ; Nacht: 1 KWh

VERSLAG NR.

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

HP 16 / 342 NO
Mechelbeek 14B/B7
2500 Koningstraat
AEW Peeters Koen BVBA
2235 Hulshout
KL 6004

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 22/12/2016 Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: appartement Bus 7
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - Renovatie
Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81; Installatie vóór na 1.10.81 - ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86
Aansluiting: Spanning: 230V ; Bescherming v/d aansluiting: 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS40A300mA
Netaftakkabel (type & sectie): EXVB4X50 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB4X10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: IT - TN - TT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 16 ; Spreidingsweerstand: 1.9 Ohm ; Alg. Isolatie niveau: >1 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS40A300mA → 8 kringen
DS40A30mA → 8 kringen

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens: AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 - N
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Badkamer mag of te werken

verlichtingsarmaturen mag te plaatsen

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting was - werd verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/12/2017 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

VISUM VAN DE VERDELER

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTRÔLEORGANISME

ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Kristoff Paternoster
Agent Onderzoeker

Elektrisch

Schema


Verlumbo Invest
Mechelbaan 14B/B7
2500 Koningshooikt

Installateur:

AEW Peeters Koen
Doodsbroekstraat 57
2235 Hulshout
0478/626557

21/12/2016

LK2.2

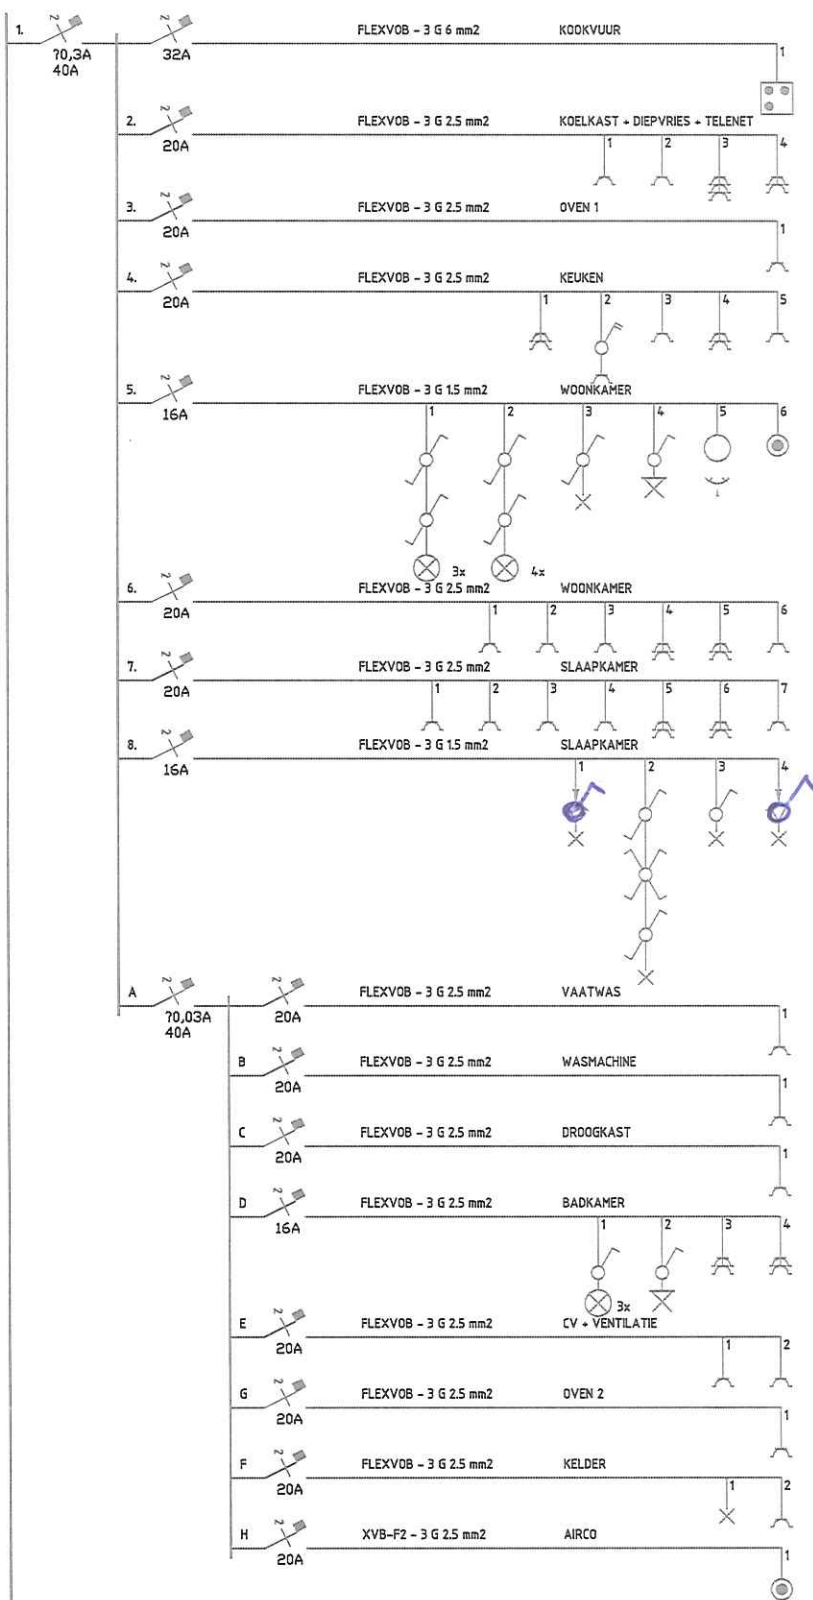

Project:

Discipline:

Fase:

Type:

Omschrijving:
Schema
Appartement 2.2Verlumo Invest
Mechelbaan 14B/B7
2500 Koningshooikt

Datum:

Get. door:

Schaal:

CONTROLOORGANISME

2220 BONDHEIDEN
Kristoff Paternoster
Agent OnderzoekerAEW PEETERS KOEN BVBA
Doodsbroekstraat 57
2235 Hulshout
0478/62.65.57

Klaar

Formaat:

Code:

A4

22/12/16

ELECTRIC
BOX
35 x 65

db 83

E11 30

db

E11

F2

F 1



1

KELDER

regenwater

Project:

Discipline:

Fase:

Type:

Omschrijving:
Kelder
Appartement 2.2

Verlumbo Invest
Mechelbaan 14B/B7
2500 Koningshooikt

Datum:

Get. door:

Schaal:

CONTROLEORGANISME

AEW PEETERS KOEN BVBA
Doodsbroekstraat 57
2235 Hulshout
0478/62.65.57

Ka Peil

Formaat:

Code:

A4

22/12/16
