

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 01/10/2020
ID-label:
Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557
Inspecteur: Matthew Clinier
Mentor: Morad asbai
Klantreferentie:
Installateur: Foorkes R.E.A.L. Fix
B.T.W. nr.: BE 726 669 362
Serie Nr.: 18460112

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Remerstraat
Huisnummer: 45
Busnummer:
Postcode: 3120
Gemeente: Tremelo
Land: België

Naam contactpersoon: Yves Foorkes
Telefoon: 0478 73 33 70
Gsm nr. (SMS):

Type : woning

EAN : 54144

Eigenaar

Naam: Dan Invest
Straatnaam: Remerstraat
Huisnummer: 45
Busnummer:
Postcode: 3120
Gemeente: Tremelo
Land: België

Installateur

Naam: Foorkes R.E.A.L. Fix
BTW nr.: BE 726 669 362
Telefoonnummer: 0478 73 33 70
E-mail: Foorkesrealfix@hotmail.com

Teller Nr.: 1SAG1100105998

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS
Spanning: 1~230V
Aantal borden: 1
Aantal kringen: 20
Meter / bord verbinding: 10 mm²
Max beveiliging: 40 A
Isolatie: 24,2 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 28,4 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	-	-
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	25		2	4
13	C	20		2	2,5
3	C	16		2	1,5
1	C	16		2	2,5
1	C	16		2	-

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK Directe aanraking ☒ OK ☐ NOK Indirecte aanraking ☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK Correcte schema's ☒ OK ☐ NOK schema in bijlage door Aceg vzw ☐
Equipotentiale verbindingen ☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting
Continuïteit ☒ OK ☐ NOK Verlichting / toestellen ☐ OK ☐ NOK ☒ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 1/10/2045



- ☐
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒
- Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1.** Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 9

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Matthew Clinier



Matthew Clinier
#111 - ACEG VZW

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte strek of onrecht strek, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be


02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 1/10/2045	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



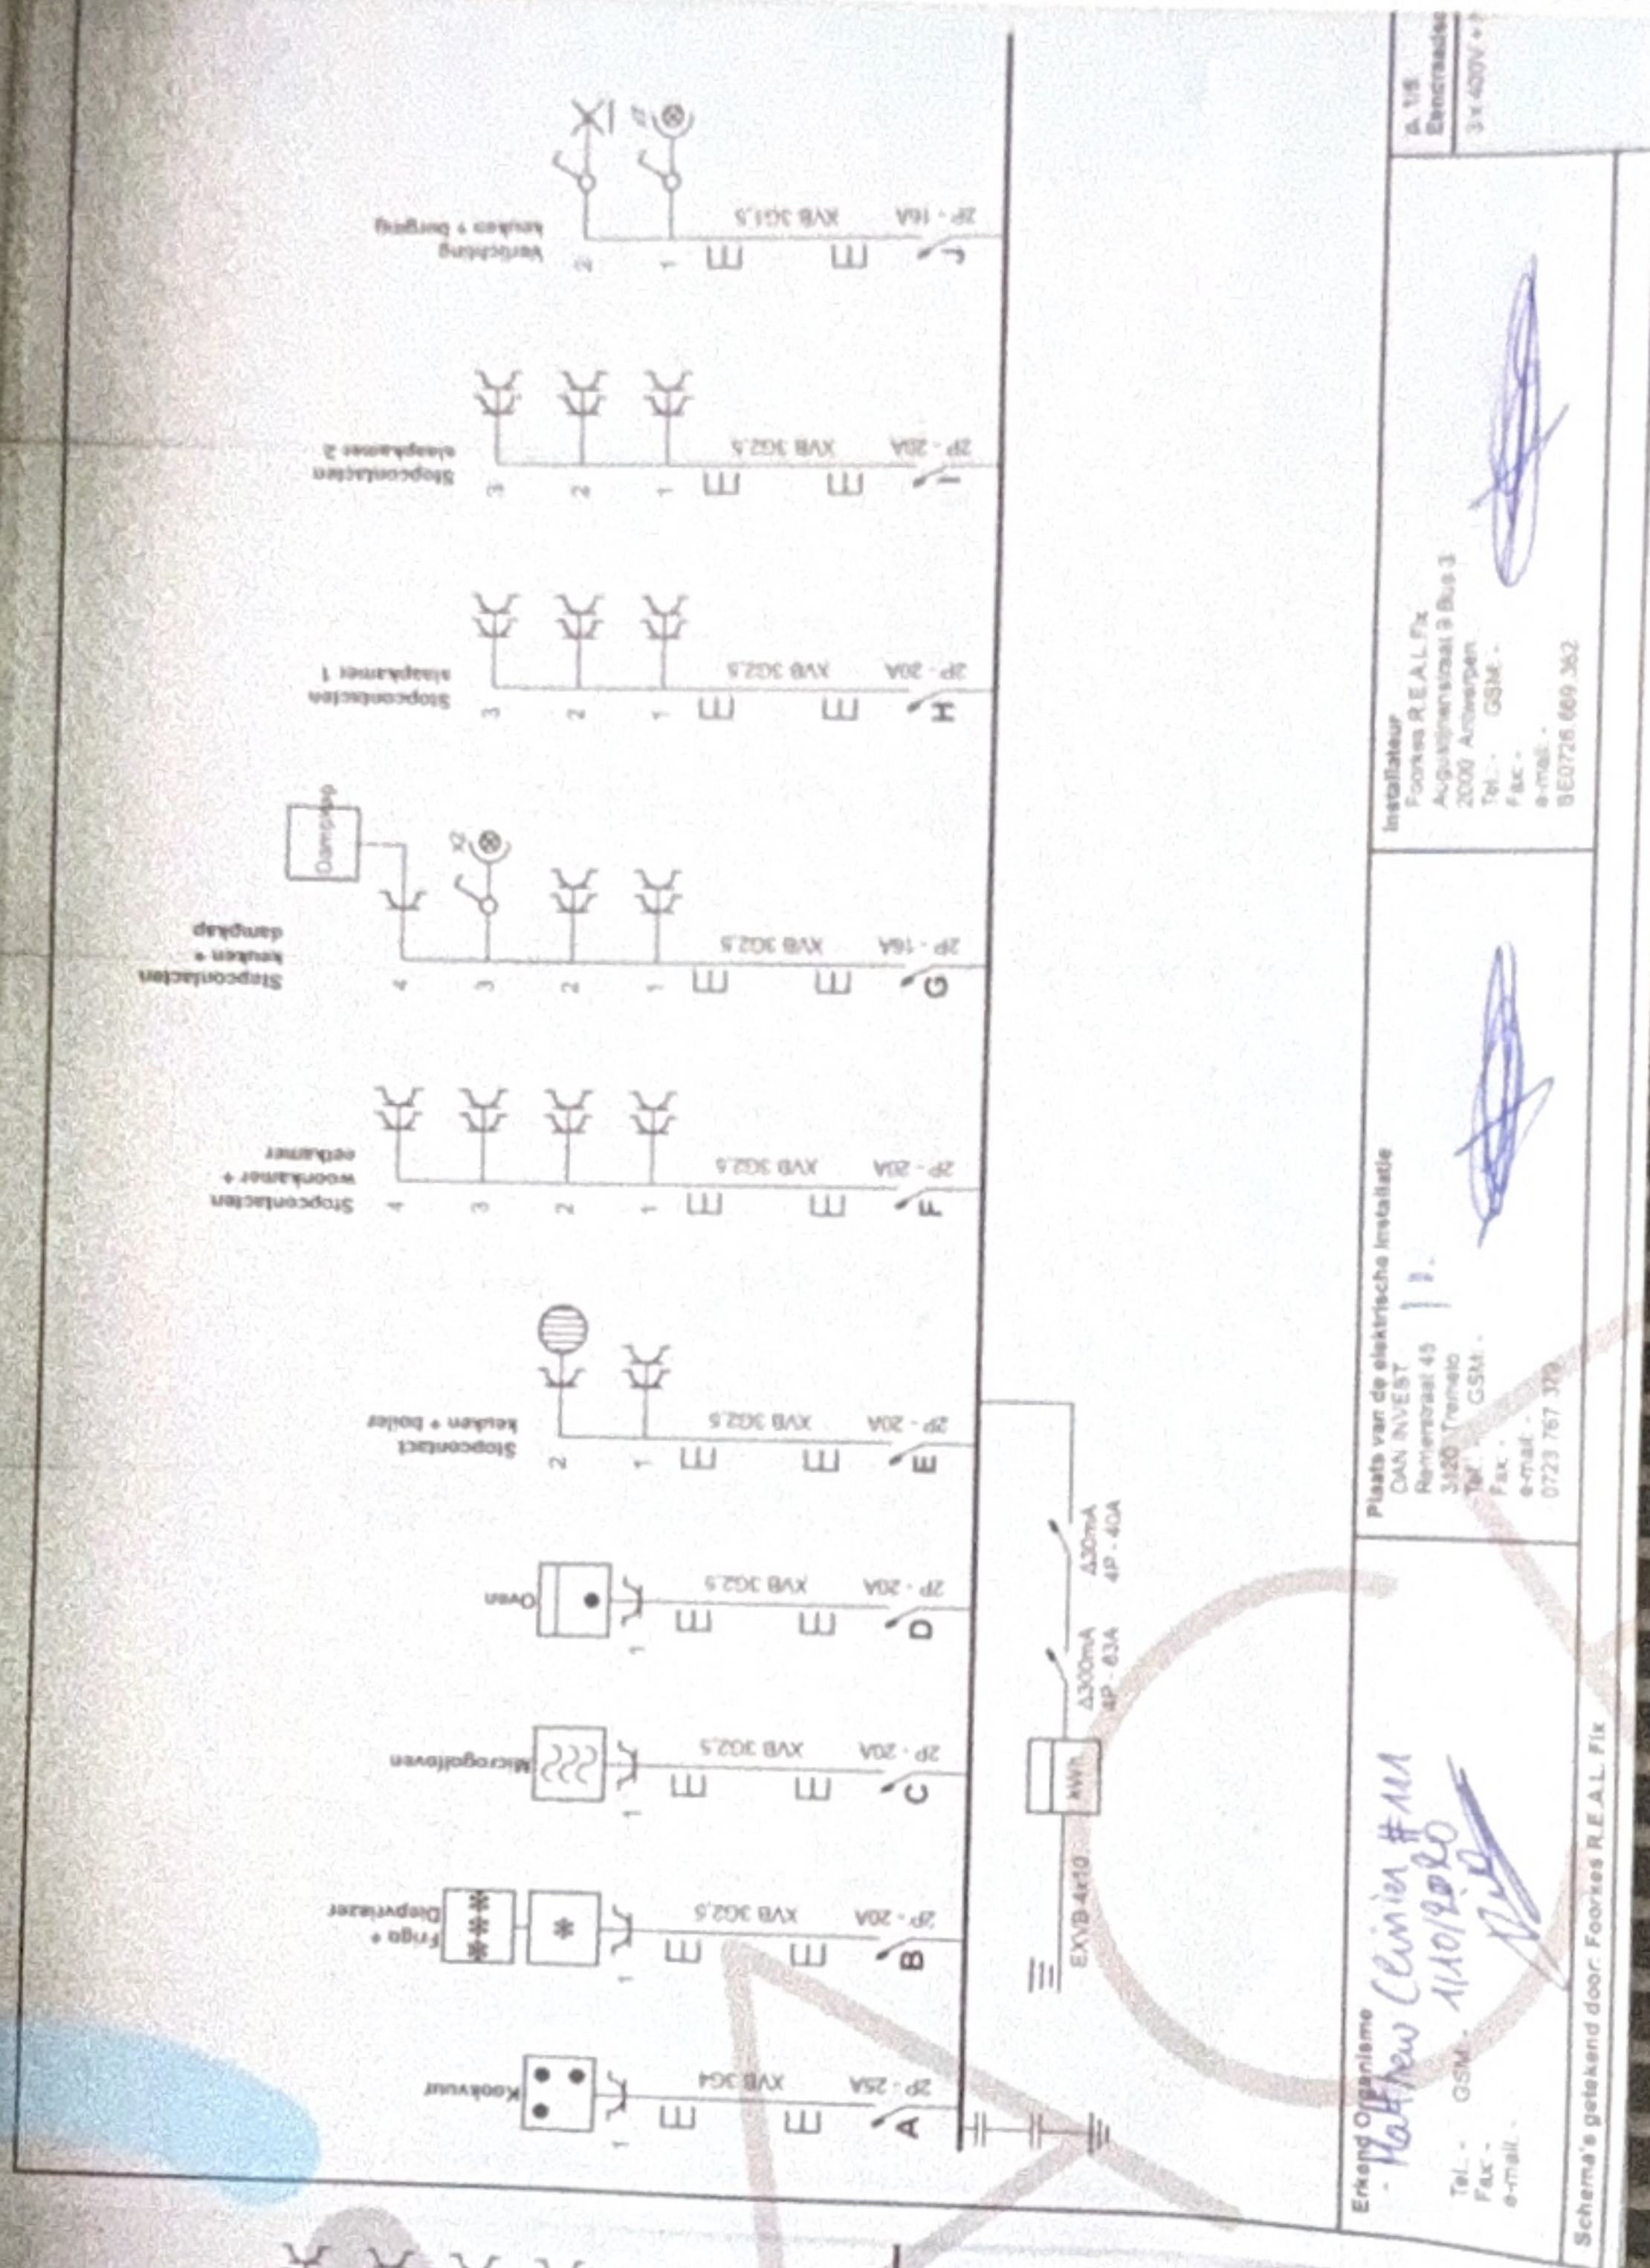

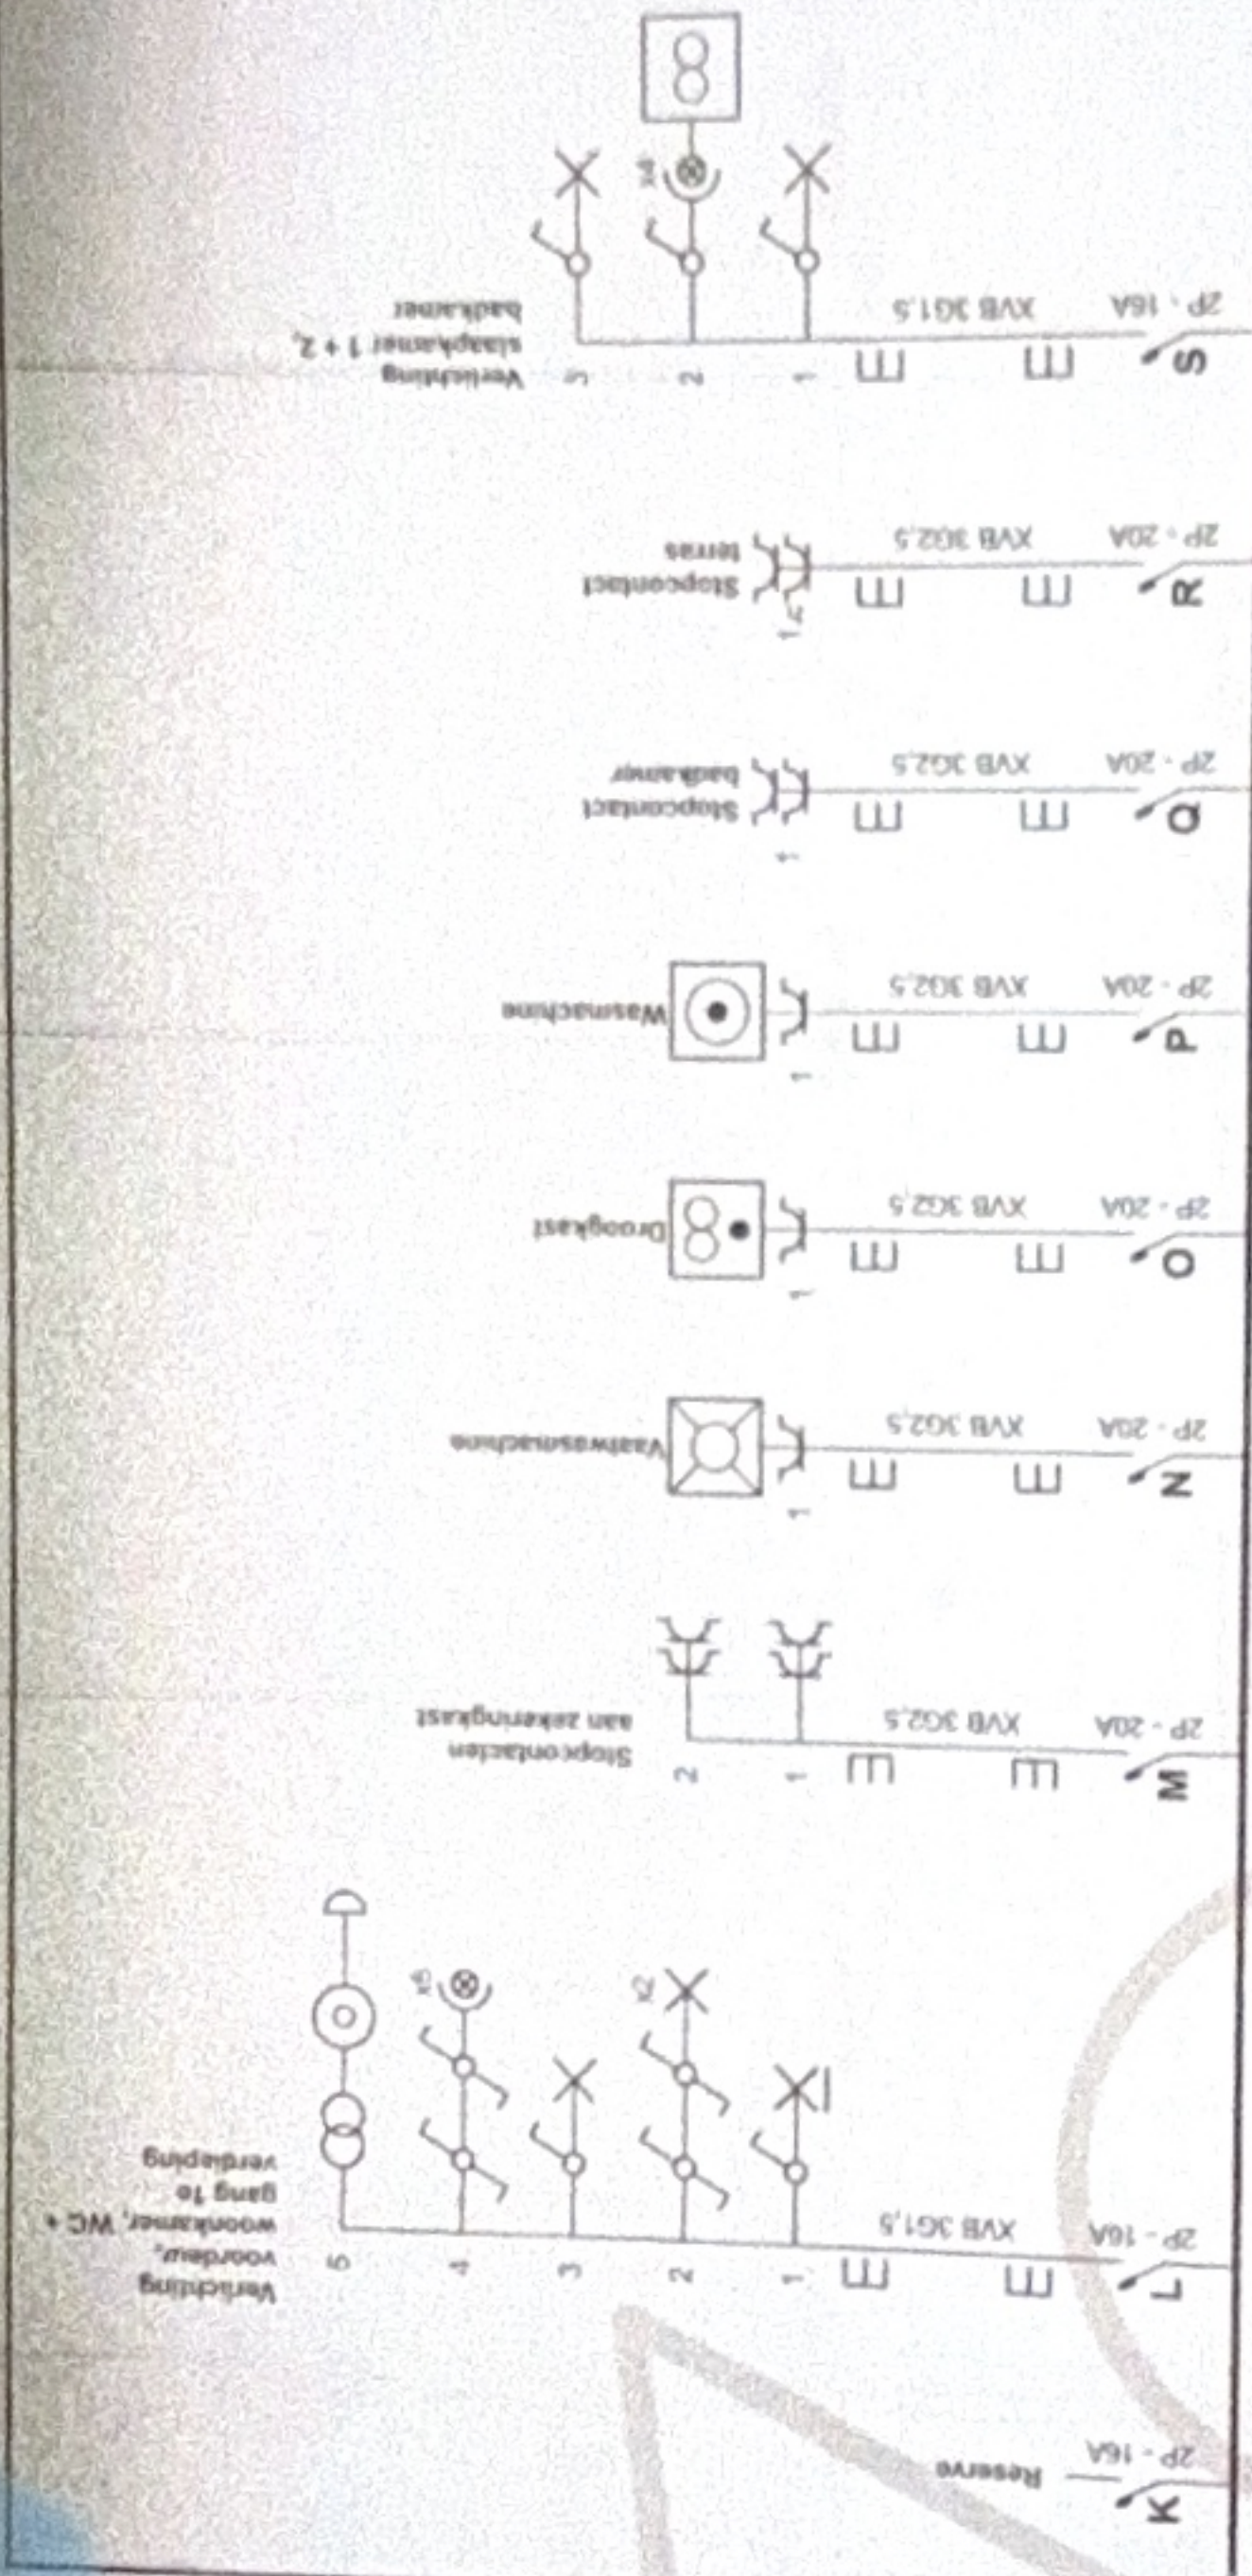

Erkend Organisme

Tel: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Schema's getekend door: Foorkes R.E.A.L. Fix


Plaats van de elektrische installatie

DAN INVEST
Remonstrat 45
3120 Tremelo
Tel. - GSM: -
Fax -
e-mail -
0723 767 379

Installer

FOOKIES R.E.A.L. Fix
 Augustijnstraat 9 Bus 3
 2000 Antwerpen
 Tel.: - GSM: -
 Fax: - e-mail: -
 BE0726 669 302

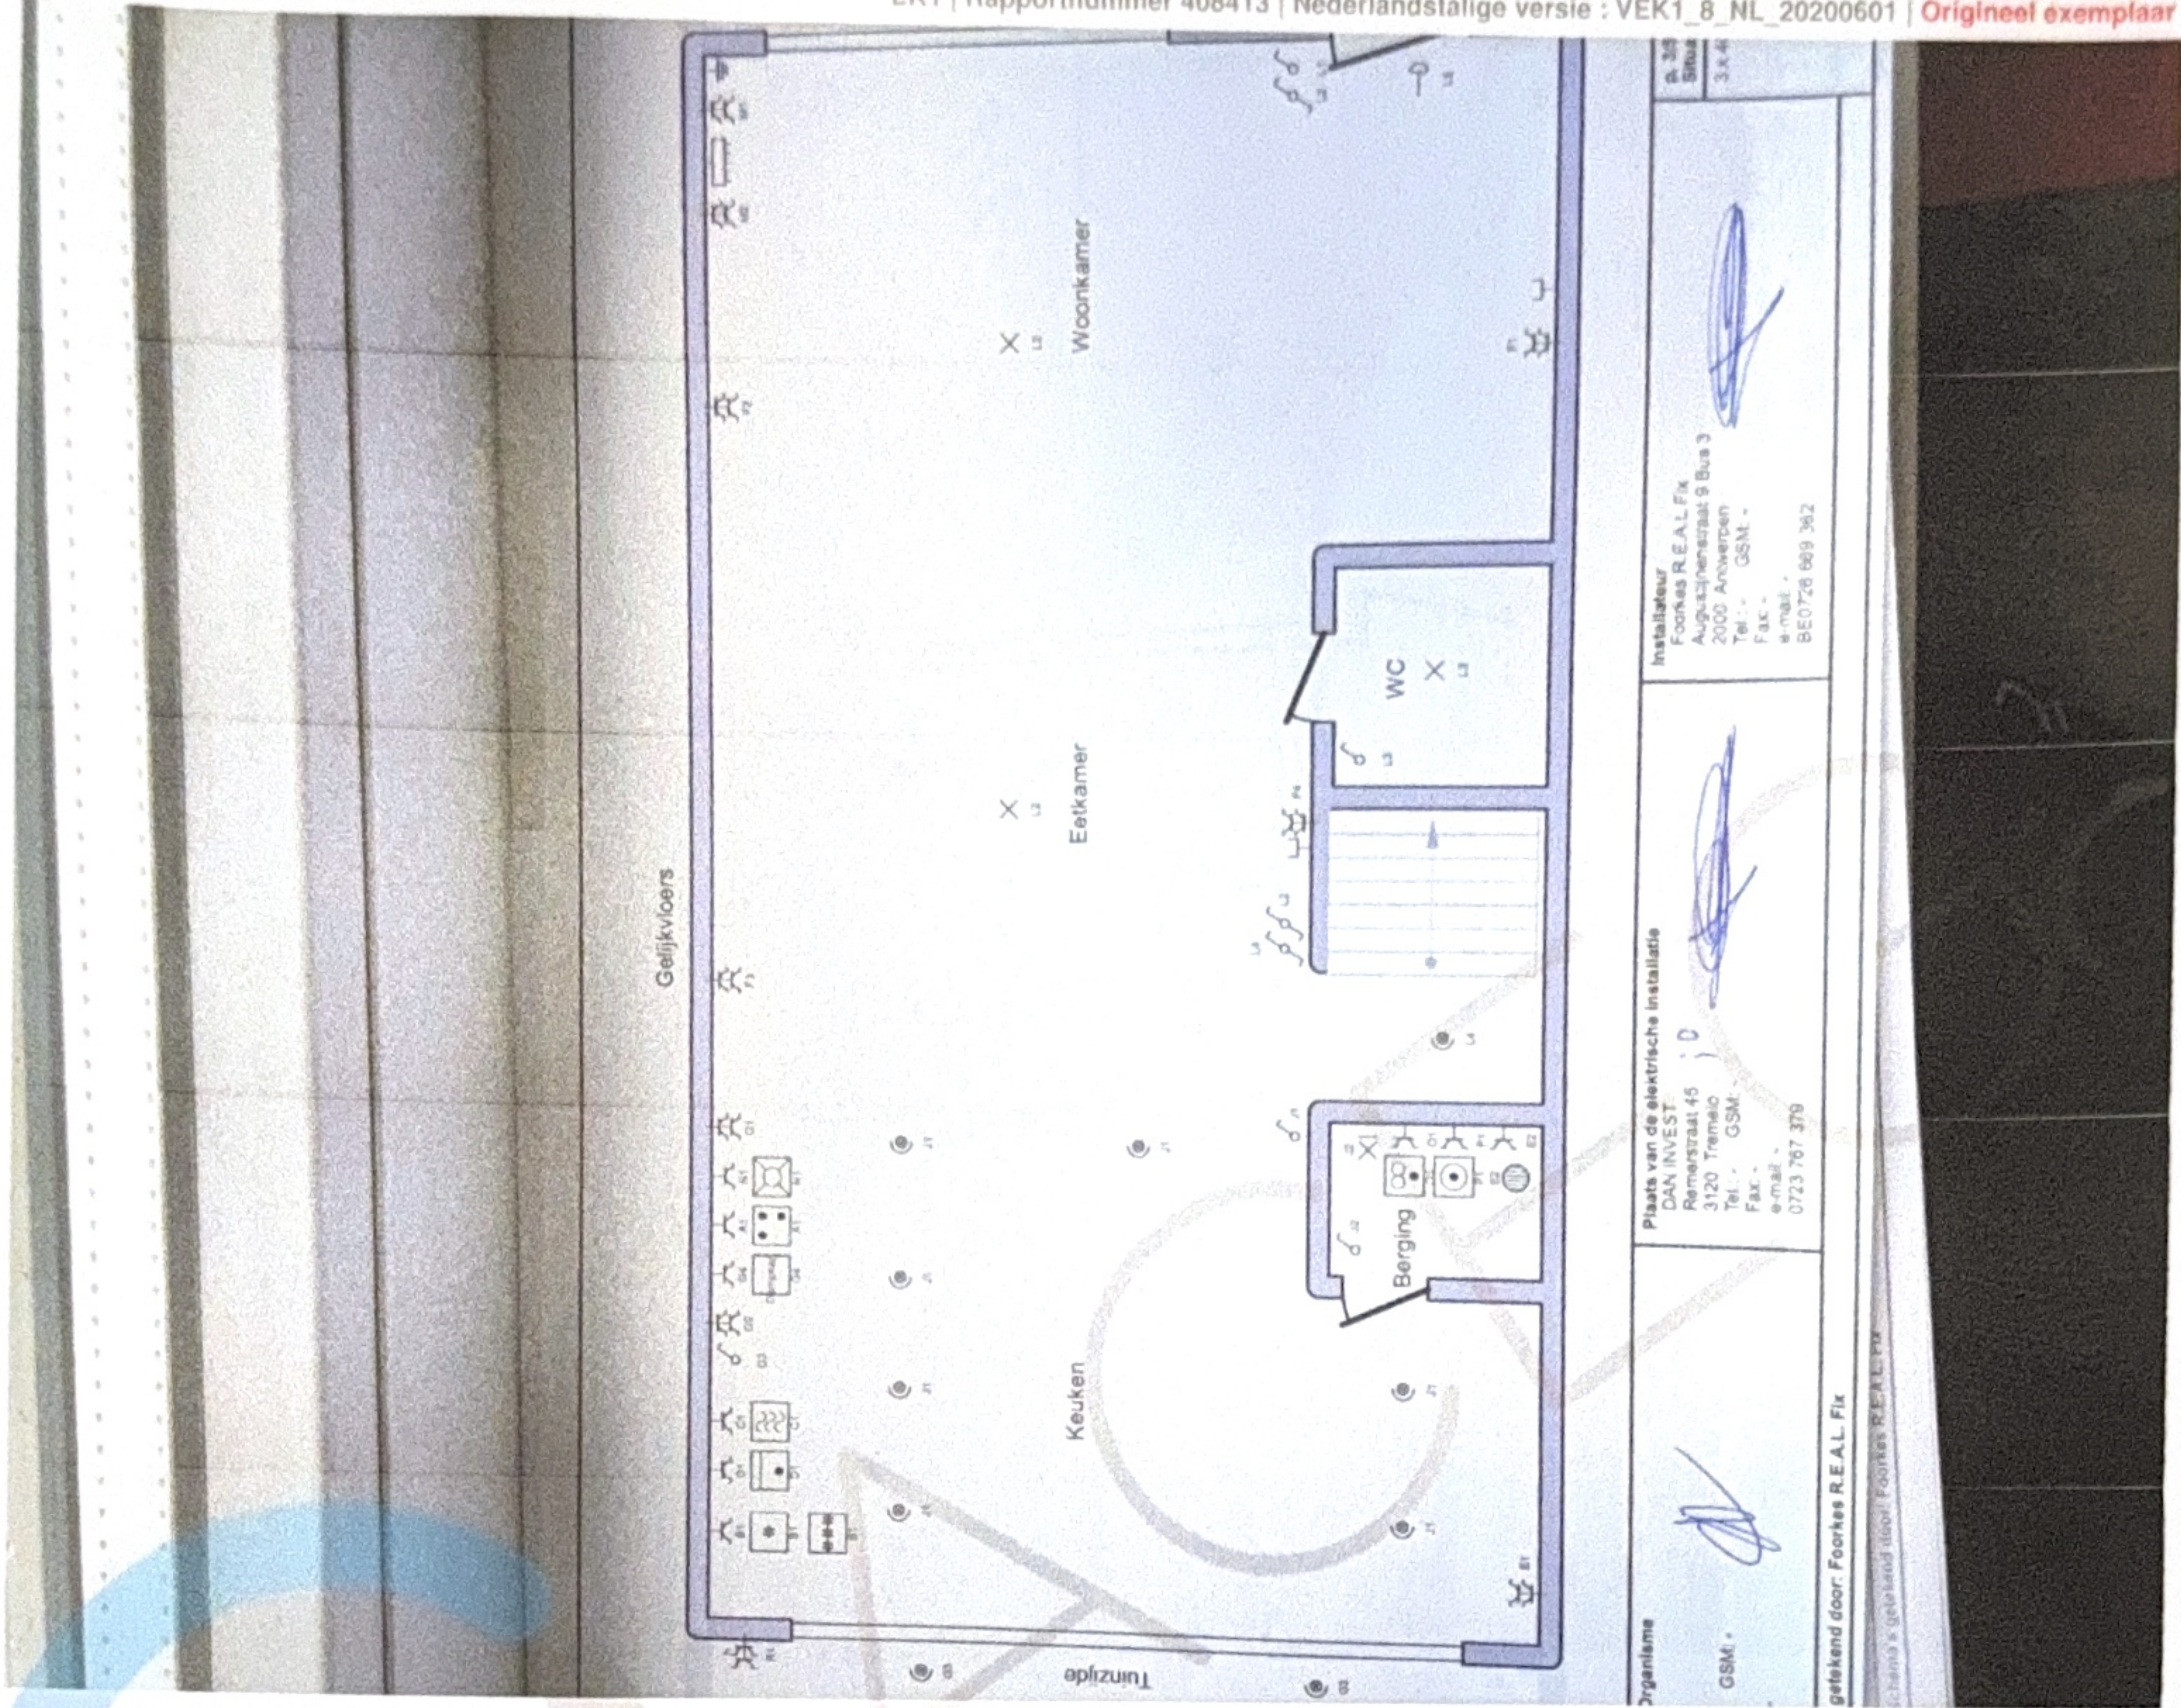

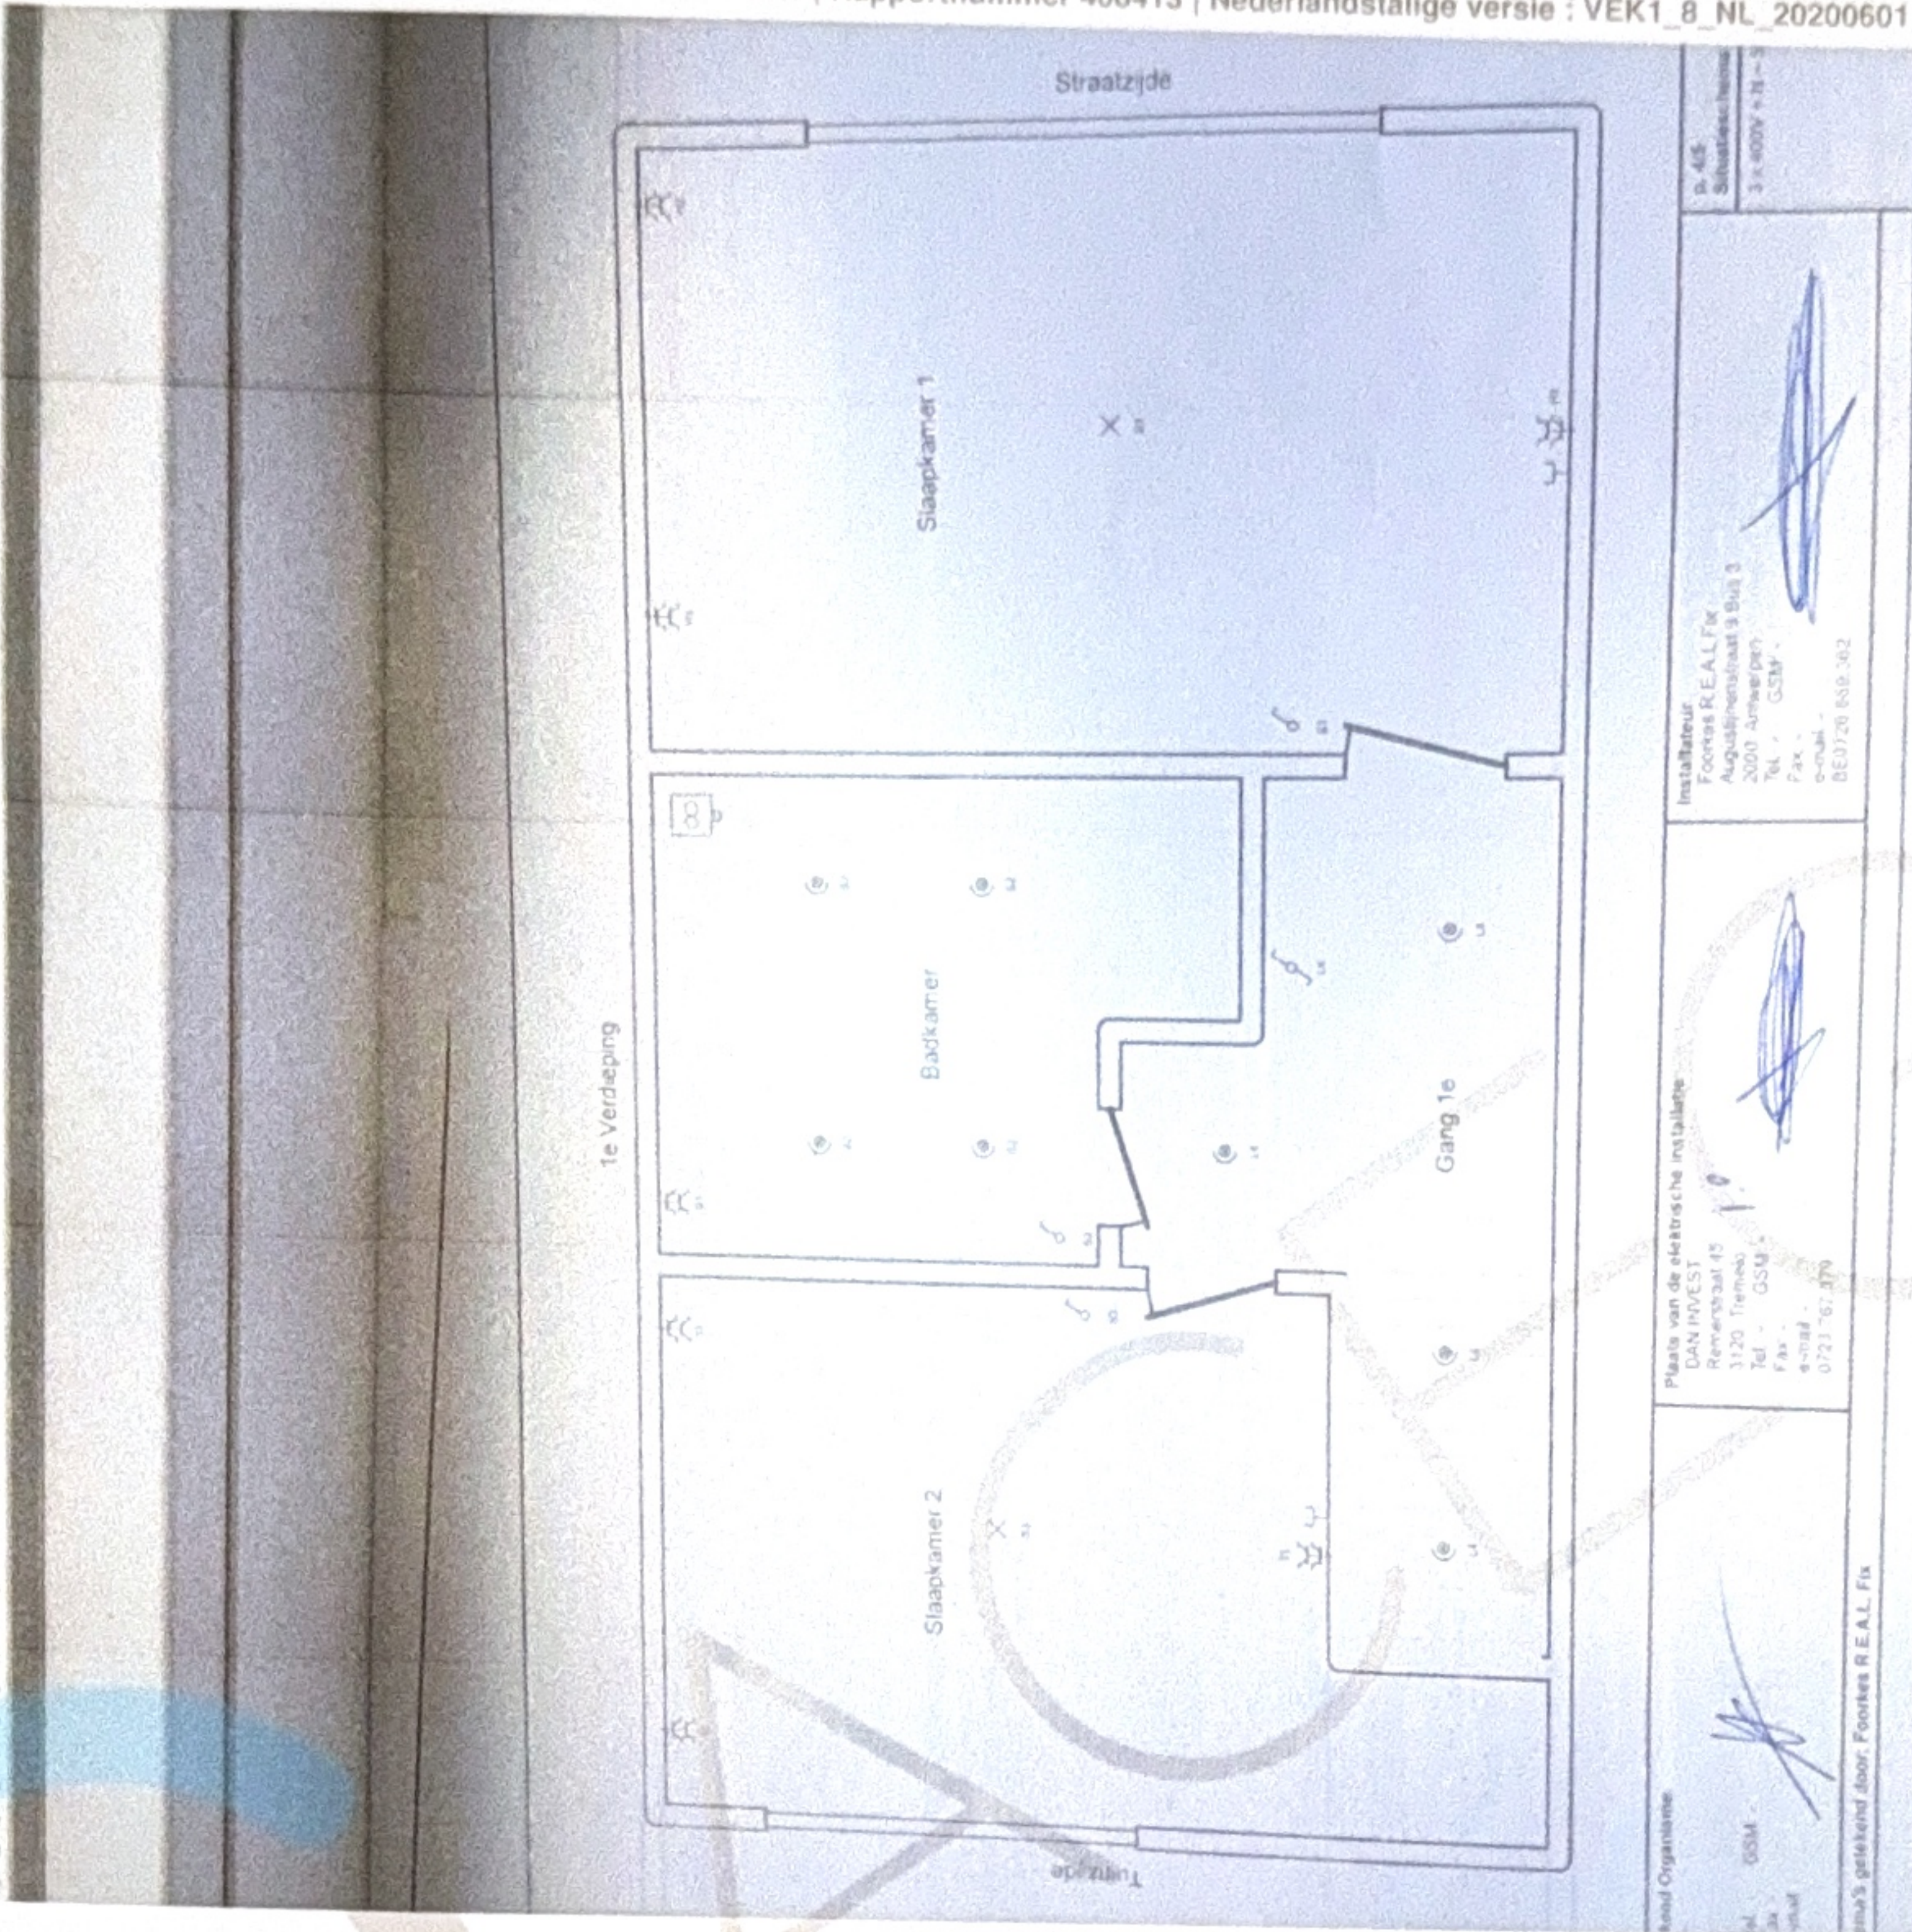

A: Kookvuur	Q: Stopcontact badkamer
B: Frigo + Diepvriezer	R: Stopcontact terras
C: Microgolfoven	S: Verlichting slaapkamer 1 + 2, badkamer
D: Oven	
E: Stopcontact keuken + boiler	
F: Stopcontacten woonkamer + eetkamer	
G: Stopcontacten keuken + dampkap	
H: Stopcontacten slaapkamer 1	
I: Stopcontacten slaapkamer 2	
J: Verlichting keuken + berging	
K: Reserve	
L: Verlichting voordeur, woonkamer, WC + gang 1e verdieping	
M: Stopcontacten aan zekeringkast	
N: Vaatwasmachine	
O: Droogkast	
P: Wasmachine	

Erkend Organisme

Tel: DSM

Fax:

e-mail:

Plaats van de elektrische installatie

CAV 1000 L3

Beveiliging 45

3120 Tienen

Tel: DSM

Fax:

e-mail: DSM

Installateur

Foortas R.L.A.L.F.

Aquafiberstraat 3 Bus 3

2000 Antwerpen

Tel: DSM

Fax:

e-mail: DSM

pl. 105

Lijst Koningen

311 2004 + 31 - 5000

Schets is getekend door: Foortas R.E.A.L. Fix





