

## DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

**Datum(s) van controle:** 11/08/2023 **Uitgiftedatum verslag:** 11/08/2023  
**Verslagnummer:** 0209-230811-03

---

### Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Normec BTV  
Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem  
T: 016 63 47 45 E: vlaamsbrabant-btv@normecgroup.com Ondernemingsnummer: 0406.486.616  
De agent-bezoeker: nummer 0209

---

### Identificatie van derden:

Opdrachtgever: FORTIS/CEGELEC BUILDING SERVICES  
Adres: HAVENLAAN 86C-BUS 201, 1000 BRUSSEL  
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: FORTIS/CEGELEC BUILDING SERVICES  
Adres: HAVENLAAN 86C-BUS 201, 1000 BRUSSEL  
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend  
Adres: ,  
BTW-nummer:

---

### Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: KB2\_BNPPF\_Branch\_BERTEM  
Adres: TERVUURSESTEENWEG 177, 3060 BERTEM  
EAN- code:  
Nummer teller: 72536957  
Private hoogspanningscabine: Nee  
Type installatie: bankkantoor

---

### Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)  
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

**Informatie inhoud controle:** Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast  
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



**Gegevens van de elektrische installatie:**

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm<sup>2</sup>

Type aardelektrode: Onbekend

Aantal borden: 3

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 40A/4P


Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 42/4/5 (reserve inbegrepen)

**BESCHRIJVING:**

Zie principeschema

Zie situatieplannen

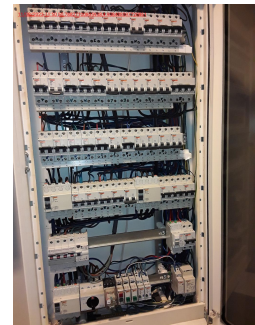

Document met uitwendige invloeden: zie doc. KB2.

Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: zie doc.KB2

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: BTV: 35/200040202

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

---

**Resultaten van de controle:****Metingen en beproevingen:**

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 21 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 2,0 MOhm

**Vastgestelde inbreuken:**

- 1 Het stroombaanschema / principeschema strookt niet met de werkelijkheid (Boek 1: 3.1.2.1).de bijgevoegde kringbeschrijvingen kloppen
- 2 De situatieplannen stroken niet met de werkelijkheid (Boek 1: 3.1.2.1).

**Opmerkingen:**Geen

---



**Besluit van de controle:**

- 3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1, van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.**

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

**Tijdstip van afwerking:**

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

