ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 12/05/2026 **Inspecteur:** Koen De Lausnay **Mentor:** **Installateur:** De Beule & partners bvba

ID-label:

B.T.W. nr.:BE 0806 807 693

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 18460128

Datum verslag: 12/05/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Schoolstraat
Huisnummer	37
Busnummer	
Postcode	9160
Gemeente	LOKEREN
Land	België

Eigenaar

Naam	Tuncel Sabahatdin
Straatnaam	Schoolstraat
Huisnummer	37
Busnummer	
Postcode	9160
Gemeente	LOKEREN
Land	België

Installateur

Naam	De Beule & partners bvba
BTW nr.	BE 0806 807 693
Telefoonnummer	0495 20 29 53
E-mail	Filip.de.beule1970@gmail.com

Type : Werfaansluiting **EAN** : 54 **Teller Nr.:** : Nog te plaatsen

☑ **Niet meegedeeld**

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole van een tijdelijke werfinstallatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.4. en 4.2.4.4. en 7.4.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 1000 MΩ

OK



RE: 5,6 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	20		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	OK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	niet van toepassing	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	OK		
Uitwendige invloeden	NVT				

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 12/5/2027

☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☐ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

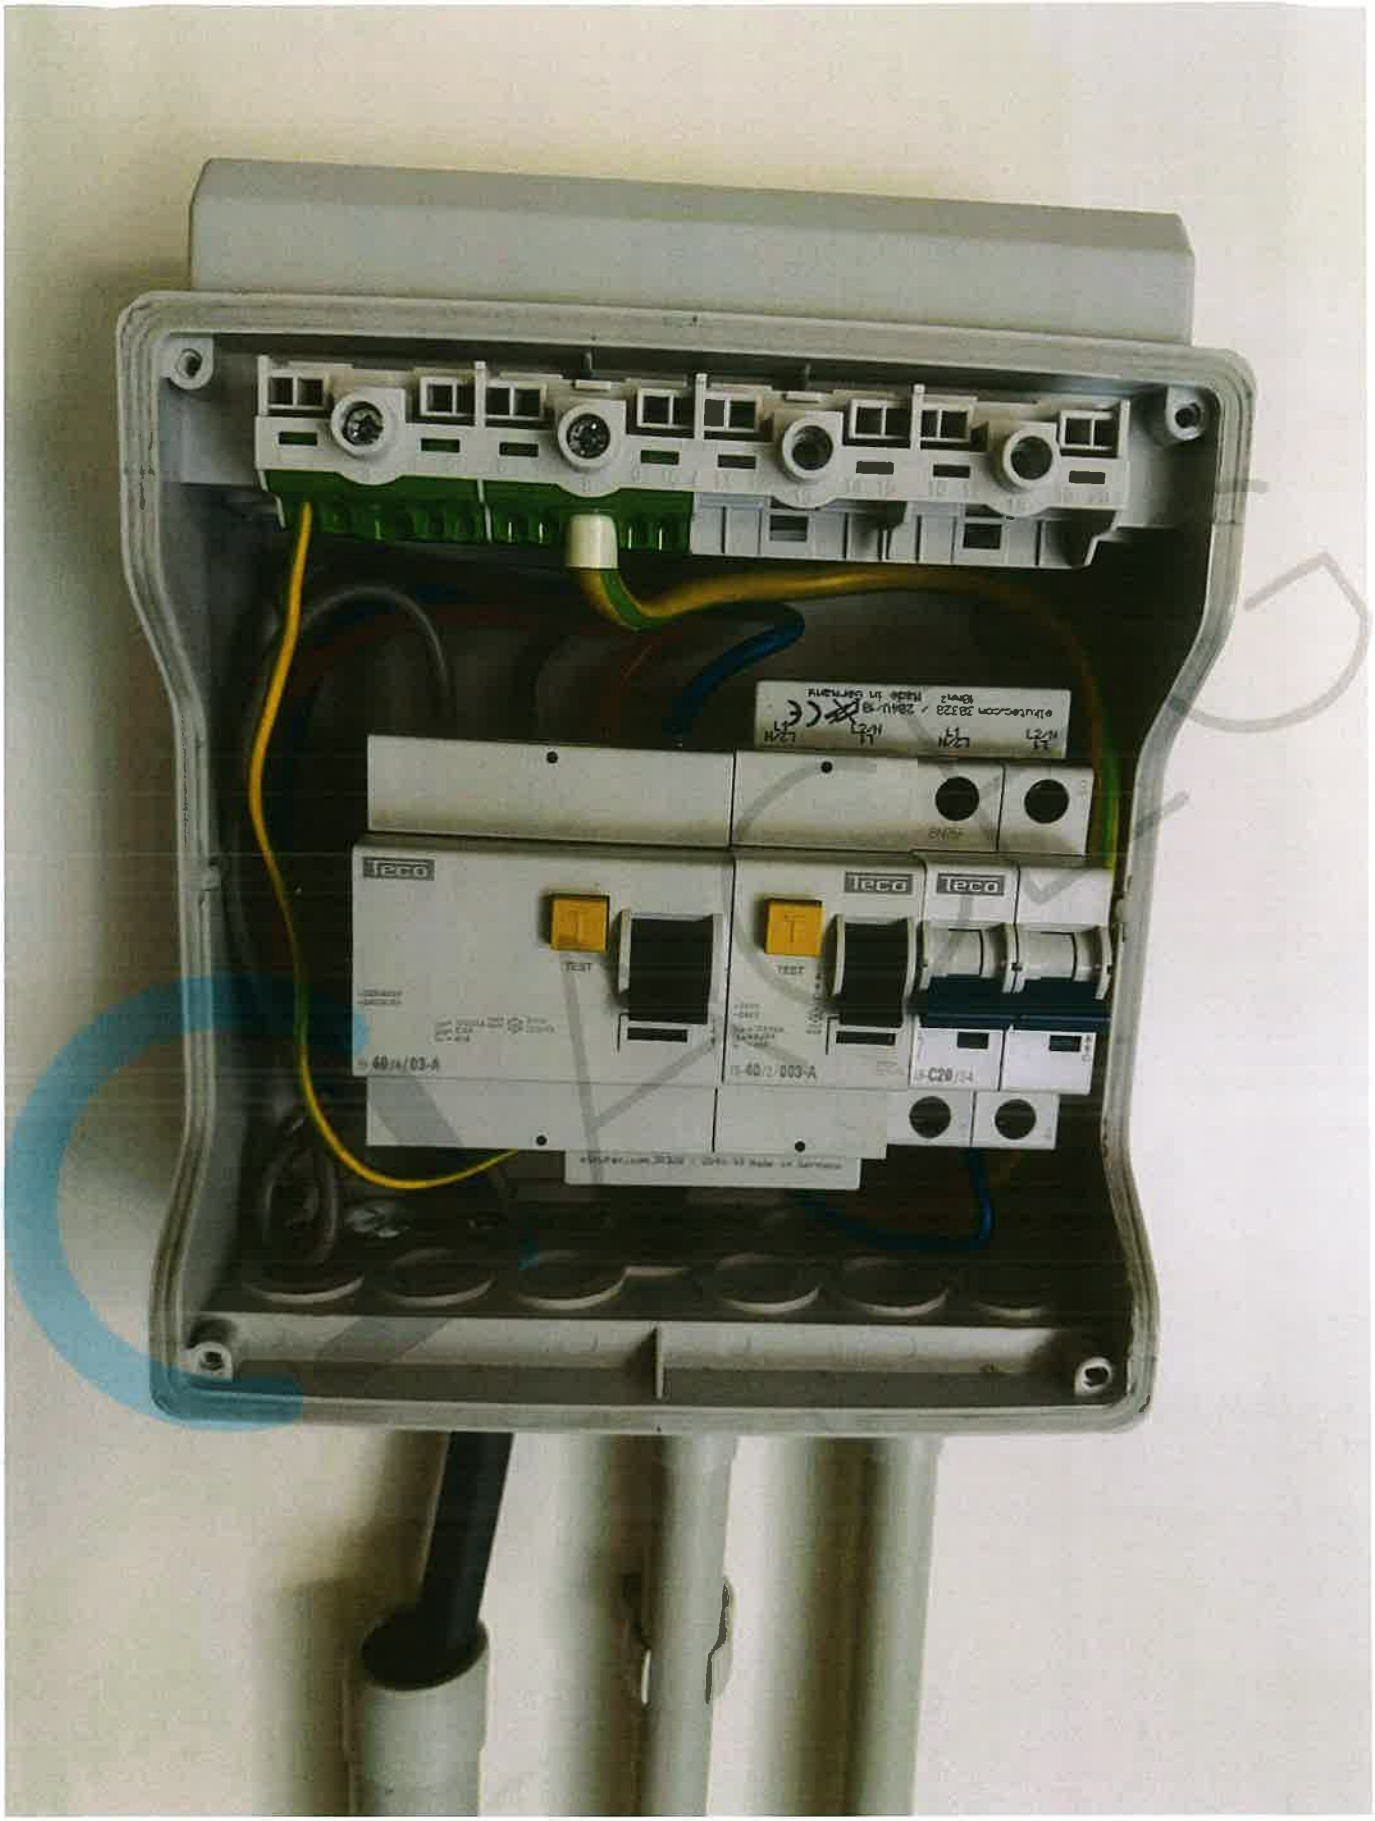
Inspectietijd: van 08:35 tot 09:08

De inspecteur Koen De Lausnay



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**	**Stap 4**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 12/5/2027	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.


teco
teco
teco
TEST
TEST


Eurotest 61557
METREL
EARTH 300Ω
5.82Ω
RC
RP
0.0kΩ
0.1kΩ
FUNC Ilim
ESC
SETUP
ON/OFF
F1
F2
F3
F4
RLOOP N-PE
PE
ZLOOP
PE
ZLINE
RCD
PE
LOCATOR
POWER, ENERGY

F1
F2
F3
F4
HELP
ON/OFF
RCL
SETUP
ESC
FUNC U1SO L1.1M
>1000MΩ Um 262V
250V 0.50MΩ
METREL
Eurotest 61557
POWER, ENERGY
LOCATOR
RCD
PE ϕ
ZLINE
PE ϕ
ZLOOP
PE ϕ
RLOOP N-PE ϕ
CE
